

Unternehmen _____ Baustelle _____ Fall Nr. _____

Bestelldatum _____ Gewünschtes Lieferdatum _____ Schacht Nr. _____

 Lieferung Canplast Vom Kunden entführt Andere _____

- 1. Ausführung** Schachtboden Schlammstammler **2. Material** PVC PE PP
 Kompletter schacht Druckbrecherschächte
- 3. Schachtröhre** Ø _____ mm **4. Bodenform** Durchlaufrinne Konisch Gerade Gerade im Gefälle _____ %
 andere _____
- 5. Einlauf** Ø _____ mm **6. Gefälle** _____ % **6b. zu +** _____ mm
- 7. Auslauf** Ø _____ mm **8. Gefälle** _____ % **8b. zu +** _____ mm **9. Serie** _____
- 10. Gesamthöhe** _____ mm
- 11. Winkel** _____ rechts gerade links

Zusätzliche Einläufe

12 Ø in mm	13 Winkel in Grad	links	rechts	14 Gefälle %	15+16 Höhe Einlauf
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____

- 17. Bankette** 5/10 7/10 10/10 andere
- 18. Exzentrisch** rechts $e^* =$ _____
 links $a^* =$ _____
 $b^* =$ _____

*min. einen Wert

Gerader Einstieg

19. Durchmesser Mannloch _____ mm

20. Höhe Mannloch _____ mm

Kegel

21. Durchmesser Mannloch _____ mm

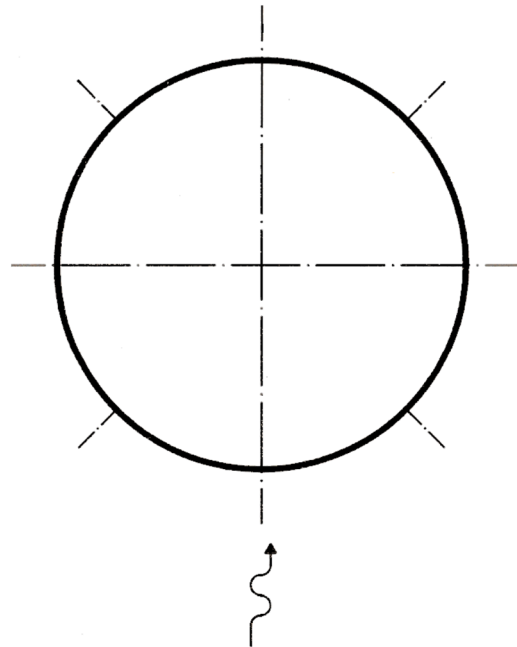
22. Höhe Konus _____ mm

Verschiedene

23. Mauerkragen Ø _____ mm

24. Tauchbogen beim Einlauf beim Auslauf

25. Höhenunterschied _____ mm

26. Zweiteilig


Bestellt von _____

Phone _____ Fax _____

E-mail _____

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR CANPLASTVORFABRIZIERTE SCHÄCHTE UND SPEZIALANFERTIGUNGEN AUS PVC, PE ODER GUP

1. Fabrikation

1. Nur eine mit allen erforderlichen Abmessungen versehene Bestellung kann in Fabrikation gegeben werden.
2. Auf Mass fabrizierte Bauteile können nicht mehr zurückgenommen werden.
3. Bei der Bestellung bitte genau hinweisen, ob Grundwasser vorhanden ist. Wenn möglich, bitte die Höhe des Grundwasserspiegels über Rohrachse der Sammelleitung angeben.
4. Falls während der Fabrikation von Bauteilen nach Mass der Kunde einen Baustopp erteilt, gehen die bereits entstandenen Kosten zu Lasten des Kunden.

2. Lieferfrist

1. Unsere Lieferfristen verstehen sich ab Werk (ab Lager oder laufender Fabrikation).
2. Gewöhnliche, gängige Bauteile werden im Normalfall innert 48 Stunden hergestellt.
3. In Ausnahmefällen (Notfall, Zwischenfall auf der Baustelle, usw.), kann diese Frist, nach Absprache mit dem Werkstattchef, reduziert werden.
4. Im Falle von Sammelbestellungen (mehrere Bauteile), wird das erste Stück innerhalb von 48 Stunden hergestellt, die übrigen bestellten Stücke nach vorgängig verabredeten Fristen (bitte mitteilen, welche bestellten Stücke Fabrikationsvorrang haben).
5. Ganz spezielle Bauteile benötigen eine Fabrikationsdauer von mehr als 48 Stunden, die Lieferfristen werden von Fall zu Fall vorgängig abgesprochen (komplette Schächte, PE-Schächte, Druckbrecherschächte, Regenüberläufe, usw.).

3. Lieferung

1. Die vorfabrizierten Bauteile werden franko Baustelle geliefert oder bei unserem Regional-Händler deponiert, gemäss Verfügbarkeit unserer Transportmittel.
2. Im Notfall kann der Kunde das Endprodukt in unserer Werkstatt selbst abholen.
3. Nur eine leichtzugängliche Baustelle ermöglicht unsere franko Lieferung per Lastwagen.
4. Der Ablad geht zu Lasten des Abnehmers.
5. Mit der Unterzeichnung des Lieferscheines bestätigt der Kunde, dass er die gelieferte Ware in einwandfreiem Zustand entgegengenommen hat.
6. Schäden, die beim Abladen, beim Lagern oder beim Versetzen entstanden sind, gehen zu Lasten des Kunden.

4. Verlegung/Montage

1. Die Verlege-bzw. Montage-Richtlinien sowie die Hinweise des Herstellers müssen unbedingt beachtet werden. Für Schäden, welche durch unsachgemässe Verlegung bzw. Montage entstehen, wird jede Haftung abgelehnt.
2. Das Verlegen bzw. Montage von gebrochenen oder gespaltener Bauteile ist strengstens untersagt, da eine nachträgliche Reparatur nicht mehr garantiert werden kann.
3. Ausser wunschgemässen Sonderanfertigungen werden erdverlegte Bauteile immer mit Beton umhüllt.

5. Garantie

1. Für die gelieferten Bauteile übernehmen wir eine Garantiedauer von 5 Jahren, ab Datum der Lieferung.
2. Elementschäden sowie mutwillige Beschädigungen sind von unserer Garantie ausgeschlossen.
3. Druckwiderstände, chemische Widerstandsfähigkeit und Wärmebeständigkeit sind beschränkt (siehe technischer Anhang und Normen).
4. Ohne spezielle Absprache mit dem Hersteller sind Sonderanfertigungen von der Garantie ausgeschlossen.
